

ออกแบบและตั้งต้นทุนฐาน

วาง To-Be Architecture, Quality Gate และ Cost Baseline ก่อนลงมือจริง

13 SP

Story Points ปิดครบ

18,823 THB

Cost Baseline

$\geq 85\%$

Coverage Target

ภาพรวมสปรินต์

ออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายและกำหนดกรอบคุณภาพ/งบประมาณที่ใช้ควบคุมการพัฒนาจริง

W5–W7

ช่วงงาน

13 SP

ปิดครบ

4

Issues

36 h

Capacity / Sprint

ทีมและความรับผิดชอบ

ภาณุวัฒน์ คำคำ

PM / Developer

ประมาณการต้นทุน · budget worksheet · WBS

เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์

QA / Tester

กำหนด coverage และ quality gate

ณัฐภาพ สายหล้า

Tech Lead / Architect

ออกแบบ To-Be และมาตรฐาน CI

เป้าหมายหลัก

- ▶ เทียบ As-Is กับ To-Be และประเมิน ISO 25010
- ▶ ออกแบบ SQLite + Repository + Strategy + Member tier
- ▶ กำหนด Communication Matrix, DoR และ DoD
- ▶ อนุมัติ Cost Baseline 18,823 THB + Threshold คุมงบ


เส้นทาง W5-W7

เปลี่ยนจากแนวคิดสถาปัตยกรรมให้เป็นแผนที่วัดและควบคุมได้



To-Be Architecture ที่ออกแบบไว้

แยกความรับผิดชอบและเตรียมทางย้ายจาก JSON ไป SQLite

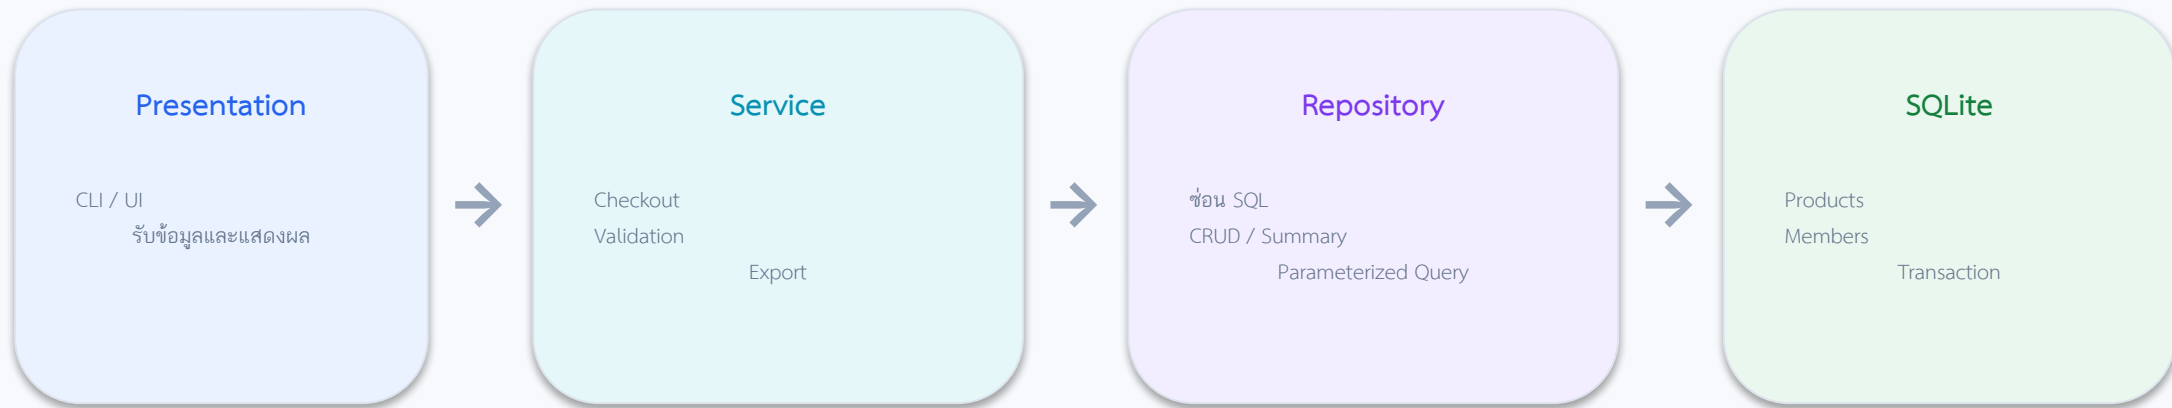

- Singleton จัดการ connection · Repository ซ่อน persistence · Strategy รองรับ Member tier
- ▶ แบบออกแบบนี้ถูกนำไปพัฒนาจริงใน Sprint 5

ISO/IEC 25010: As-Is

4 มิติผ่าน · 1 มิติต้องปรับ · 3 มิติตกและต้องแก้ไขโครงสร้าง

4

ผ่าน

1

ต้องปรับ

3

ตก

8

มิติทั้งหมด

อ่านคำร่วมกัน

- Reliability: JSON เขียนทับตรง → เป้าหมาย atomic write/SQLite
- Security: เตรียม parameterized query 100% เมื่อเข้าสู่ SQL
- Maintainability: Monolithic / CC 14 → เป้าหมายแยกชั้น + OOP
- Usability: เพิ่ม validator และลดความซับซ้อนของเมนู

Cost Baseline และ Quality Gate

ตัวเลขที่อนุมัติใน W7 ใช้เป็นฐานควบคุมงบ

15,000

Labor (THB)

1,000

Infra (THB)

2,823

Reserve (THB)

18,823

Approved Total

อ่านค่าร่วมกัน

- Threshold: $\leq 5\%$ ปกติ · 5–10% แจ้งเตือน · $> 10\%$ วิกฤต/พิจารณาตัด scope
- Capacity: 3 คน $\times$ 6 ชั่วโมง $\times$ 2 สัปดาห์ = 36 man-hours
- Quality Gate: $v(G) \leq 8$ · $CBO \leq 4$ · $DIT \leq 2$ · Coverage $\geq 85\%$

ความเสี่ยงของแผน

จุดที่ต้องระวังเมื่อนำ baseline ไปใช้จริง

ตัวเลขพื้นฐาน

W5 มี worksheet 39,100 THB แต่ W7 อนุมัติ 18,823 THB — ต้องระบุฐานทุกครั้ง

Capacity

36 man-hours ต่อ Sprint ต่ำกว่างาน evolution จริงที่พบในภายหลัง

Quality Target

ISO 14598 ยังเป็นเป้าหมาย ต้องวัดจริงช่วง hardening

Cost Variance

ตัวอย่าง migration: PV/EV 2,400 แต่ AC 4,000 → CV -1,600

Sprint Review & Handoff

สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป

ส่งมอบแล้ว

- To-Be Architecture + DB design
- Cost Baseline / Threshold / Capacity
- Communication Matrix + DoR/DoD + Quality Gate

ความเสี่ยง/ข้อจำกัด

- ▶ งบ W5/W7 คนละฐาน
- Capacity ต่ำกว่างานจริง
- Quality target ยังไม่ได้วัดจริง

งานส่งต่อ

- ▶ รับ CR-01 ผ่าน Impact Analysis
- ▶ ติดตามด้วย Burndown / EVM
- ▶ วัด ISO gate ในรอบ Hardening
