

ลงมือและคุมการเปลี่ยนแปลง

Change Control · EVM · Defect-driven Test · Hardening · Scope Freeze

16 SP

Story Points ปิดครบ

27 / 29

Burnup

1,350 THB

Reserve Used

ภาพรวมสปรินต์

นำแผนไปใช้จริง พร้อมควบคุม Change Request, defect, งบ และขอบเขตไม่ให้หลุด

W8–W11

ช่วงงาน

16 SP

ปิดครบ

5

Issues

93%

Burnup

ทีมและความรับผิดชอบ

ภาณุวัฒน์ คำคำ

PM / Developer

Impact Analysis · CCB · Log Work · EVM

เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์

QA / Tester

Defect-driven / integration test

ณัฐภาพ สายหล้า

Tech Lead / Architect


Root cause · review · hardening

เป้าหมายหลัก

- ▶ รับ CR-01 ผ่าน Impact Analysis และ board tracking
- ▶ ติดตาม EVM + retrospective + transition
- ▶ อนุมัติ CR-02 ผ่าน CCB และแก้ BUG-101 ด้วย 5 Whys
- Hardening โค้ดและ Scope Freeze ก่อนเข้าสู่ release

เส้นทาง W8-W11

ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีผลกระทบ หลักฐาน และเงื่อนไขปิด

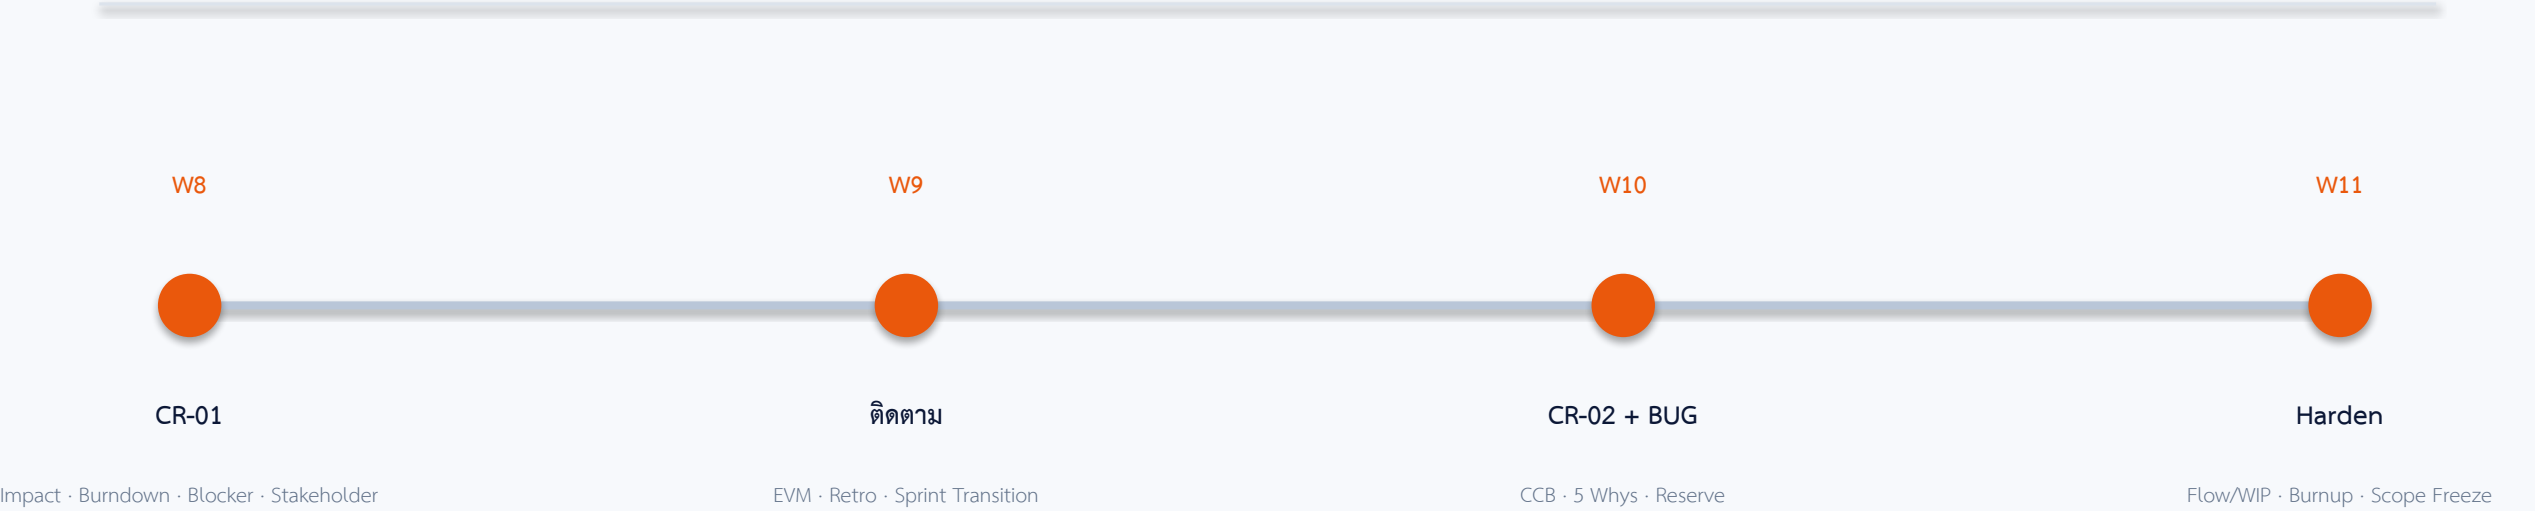

Change Request ที่ควบคุมผ่านกระบวนการ

CR-01 · Barcode + ROP

- Perfective / Normal Change
- +8 man-hours impact
- ▶ แตะ Product + Repository + ConsoleUI
- ▶ เพิ่ม test สำหรับ barcode / reorder point

CCB

CR-02 · CSV Export

- Emergency / Fast-Track
- $4.5 \text{ h} \times 300 = 1,350 \text{ THB}$
- ▶ เพิ่ม CsvReportExporter ตาม SRP
- ▶ อนุมัติผ่าน CCB และดึง reserve

BUG-101: จาก Defect สู่ Permanent Test

แก้ที่ root cause ไม่ใช่แค่ปิดอาการ

อาการ

KeyError: 'barcode' เมื่อโหลด data.json รุ่นเก่าที่ไม่มีฟิลด์ใหม่

Root Cause

Schema ใหม่ไม่มี Data Validation/default fallback ในชั้น Repository

Fix

dict.get('barcode',) และ reorder_point default = 5

Prevention

Defect-driven test + backward compatibility test เป็น regression ทวาร

Progress / Flow / Cost

ตัวเลขสำคัญก่อนแข่งจบเขต

27 / 29

Burnup

3

WIP Limit: Review

1,350

Reserve Used

1,473

Reserve Left

อ่านค่าร่วมกัน

- Burnup = 93% เหลือ 2 points ก่อน release
- WIP Limit 3 ใบช่วยลดงานค้างใน Review
- EVM Sprint 1 ที่ติดตามย้อนหลัง: PV 4,000 · EV 3,000 · AC 4,200
- Scope Freeze อนุญาตหลัง freeze เฉพาะ Critical bug / Security fix / Test

Retrospective: Mad / Sad / Glad

บทเรียนถูกเปลี่ยนเป็น action ที่วัดได้

Mad

เสียเวลา merge conflict จากการตัดโครงสร้างใหญ่ในครั้งเดียว

Sad

ประเมิน refactor ต่ำกว่าจริง เพราะ technical debt ใน app_v1.py

Glad

PyTest จับ defect ได้ก่อน demo และทิมแก้ conflict สำเร็จ

Action

แจ้ง blocker ทุกวัน · PR review $\leq 12h$ · ใช้ TDR/เขียนเทสต์ก่อนโค้ด

Sprint Review & Handoff

สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป

ส่งมอบแล้ว

- CR-01 / CR-02 ทำงานจริง
- BUG-101 แก้พร้อม regression test
- Hardening + Scope Freeze 29 points

ความเสี่ยง/ข้อจำกัด

- ▶ เหลือ 2 points ใน burnup
- E501 ยังอยู่ ณ W11
- UAT formal sign-off ยังรอ

งานส่งต่อ

- ▶ ปิด 29/29 และรัน UAT SC01-03
- ▶ ทำ Release Checklist + Final EVM
- ▶ แก้ E501 และสร้าง release tag
